


# DESC

---

QUINT FONSEGRIVES – CHEMIN RIBAUTE  
CREATION D'UNE PISTE CYCLABLE



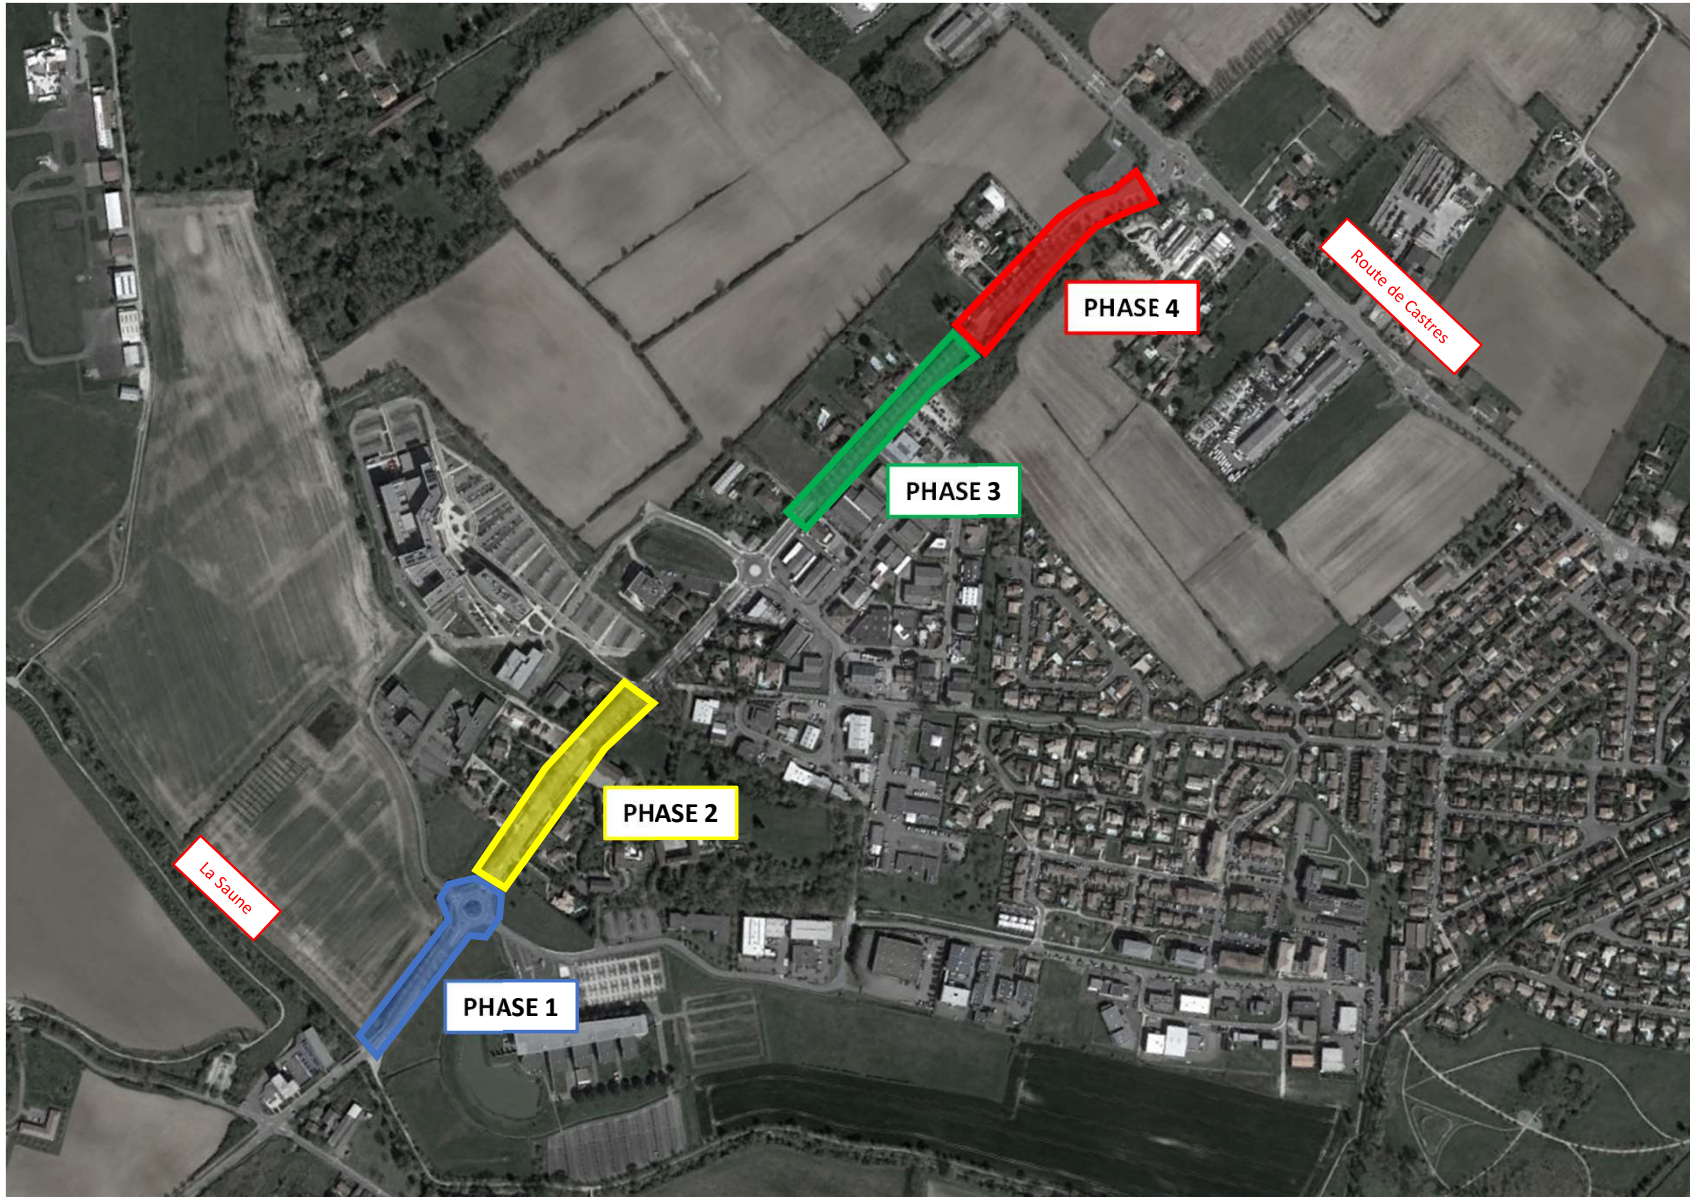

## PHASAGE GENERAL


Phase 1 : 13/05/24 – 06/24

Phase 2 : 07/24 – 08/24





Phase 3 : 08/24 – 10/24

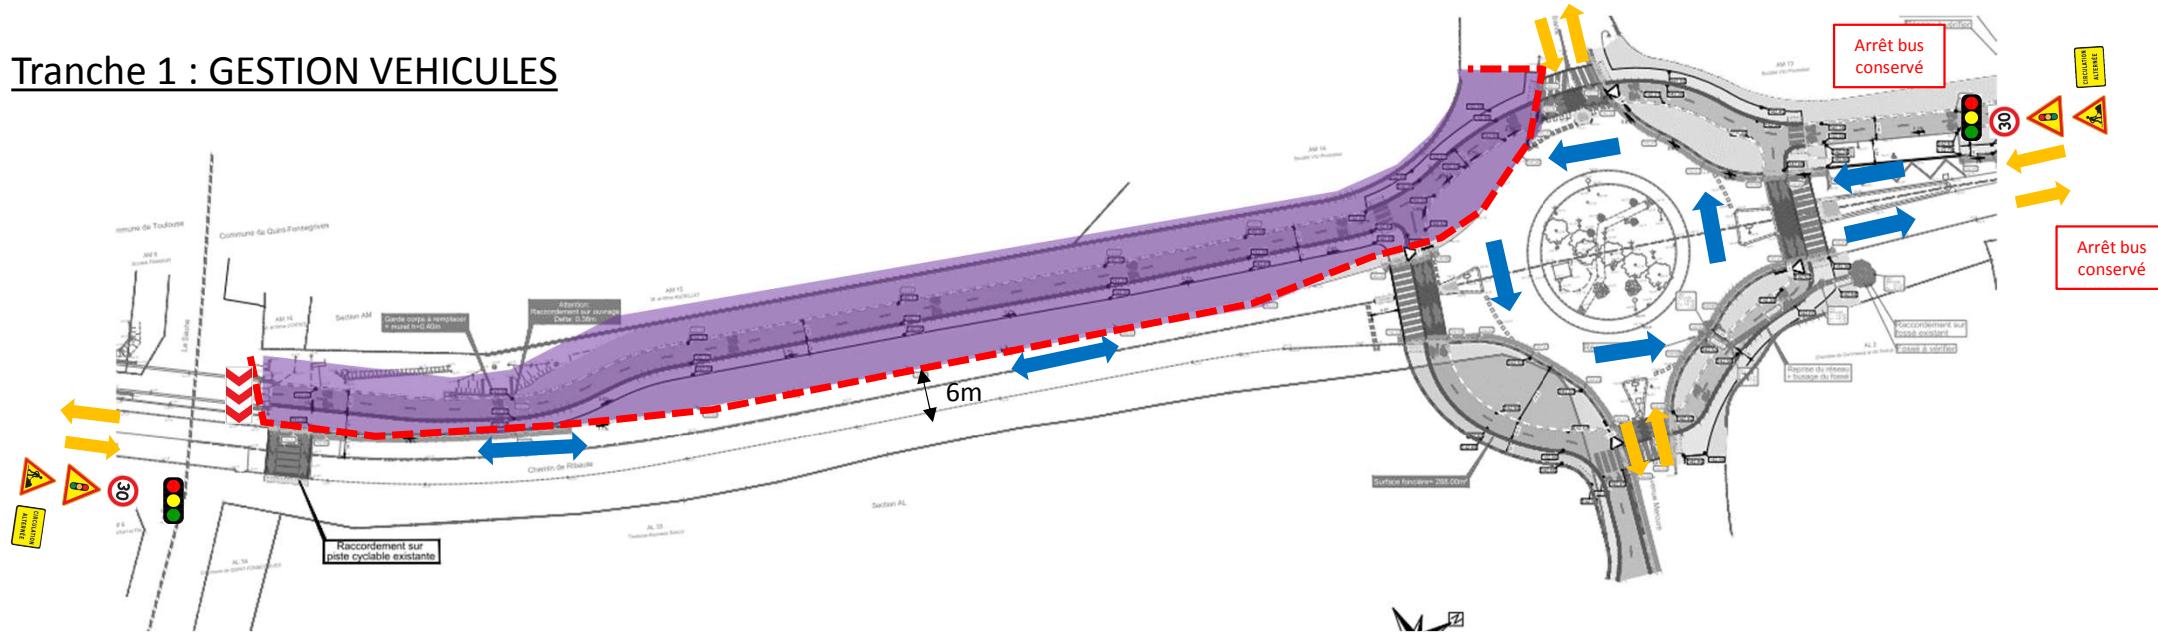Phase 4 : 10/24 – 15/12/24

## Tranche 1 : GESTION VEHICULES




### Légende

-  K16
-  Zone de travaux
-  Circulation véhicules/cycles zone chantier
-  Circulation hors chantier





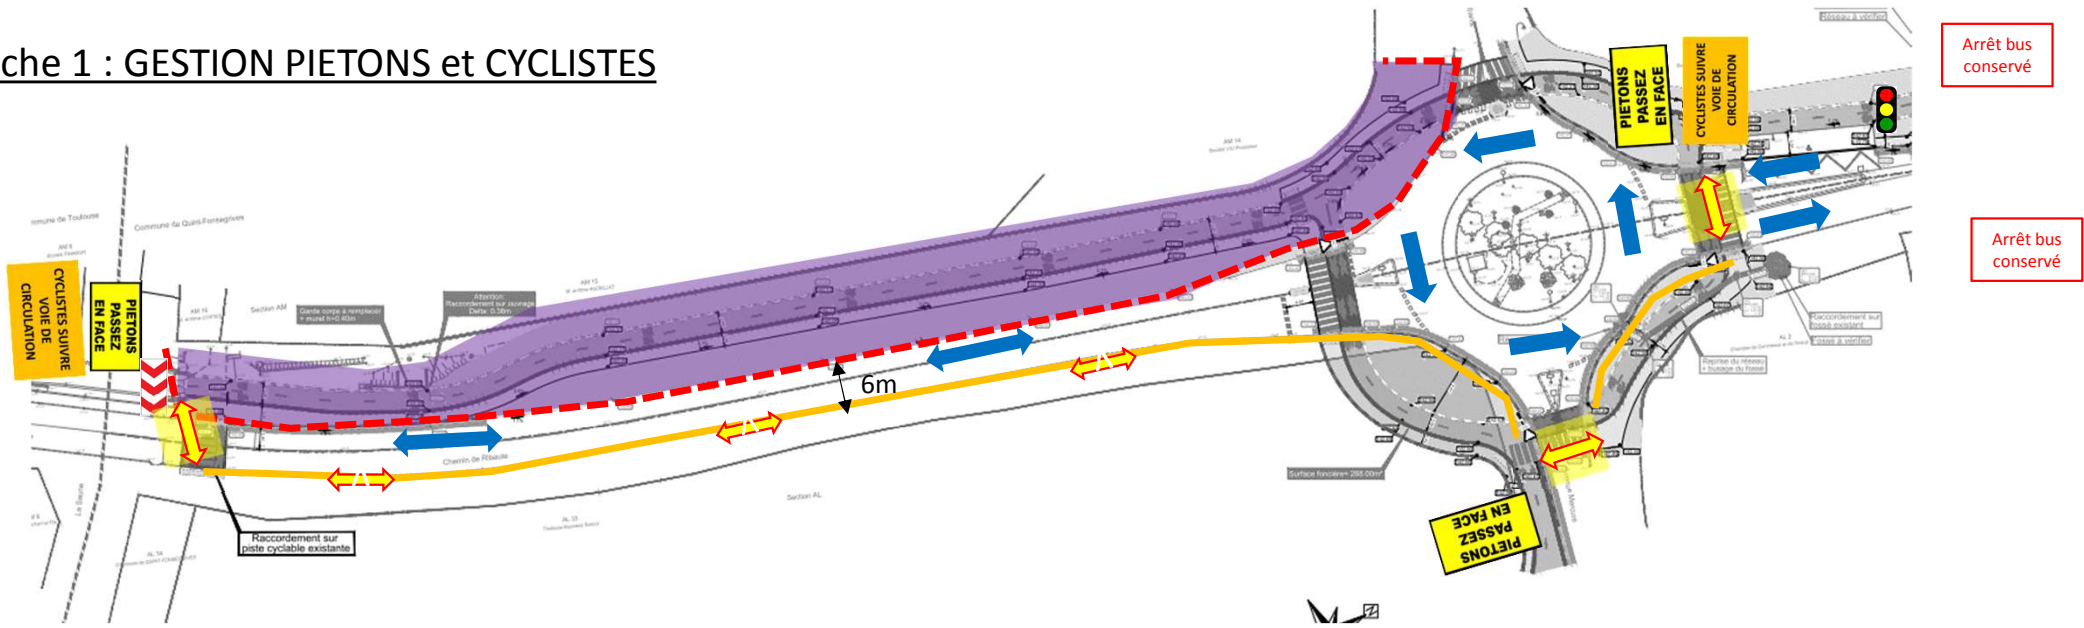

### PHASE 1.1 (05/24 – 06/24)

- Travaux sur trottoir Ouest, zone fermée K16 et barrières
- Circulation des cyclistes sur la voie de circulation – zone limitée à 30km/h
- Accès Urgence Clinique « Croix du Sud » maintenue 24h/24h
- Circulation piétonne déviée sur le cheminement existant opposé – mise en place de balisette jaune rétro réfléchissante
- Accès maintenus à TBS (piétons, cycles, véhicules, bus)
- Conservation arrêts bus « Fonsegrives Entiore » (ligne 83 + L1)

## Tranche 1 : GESTION PIETONS et CYCLISTES




### Légende

-  K16
-  Zone de travaux
-  Circulation des cyclistes sur voie de circulation – voie partagée
-  Circulation hors chantier
-  Cheminement protection balisette
-  Circulation piétons






### PHASE 1.1 (05/24 – 06/24)

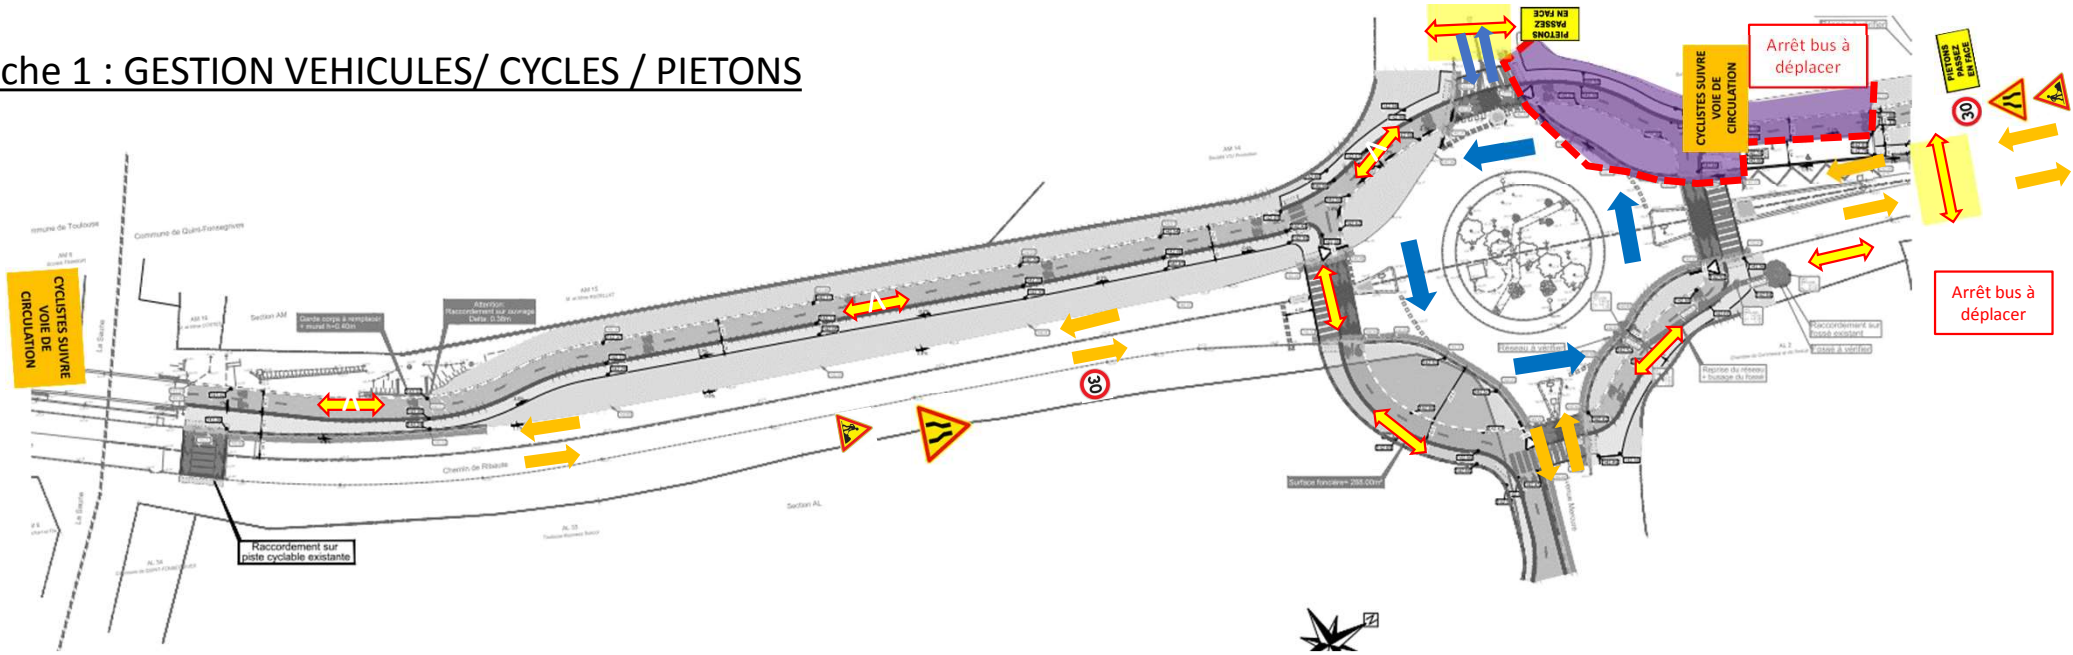- Travaux sur trottoir Ouest, zone fermée K16 et barrières
- Circulation des cyclistes sur la voie de circulation – zone limitée à 30km/h
- Accès Urgence Clinique « Croix du Sud » maintenue 24h/24h
- Circulation piétonne déviée sur le cheminement existant opposé – mise en place de balisette jaune rétro réfléchissante
- Accès maintenus à TBS (piétons, cycles, véhicules, bus)
- Conservation arrêts bus « Fonsegrives Entiore » (ligne 83 + L1)

## Tranche 1 : GESTION VEHICULES/ CYCLES / PIETONS




### Légende

-  K16
-  Zone de travaux
-  Circulation véhicules/cycles zone chantier
-  Circulation hors chantier
-  Circulation piétons






### PHASE 1.2 (06/24 - 5 jours)

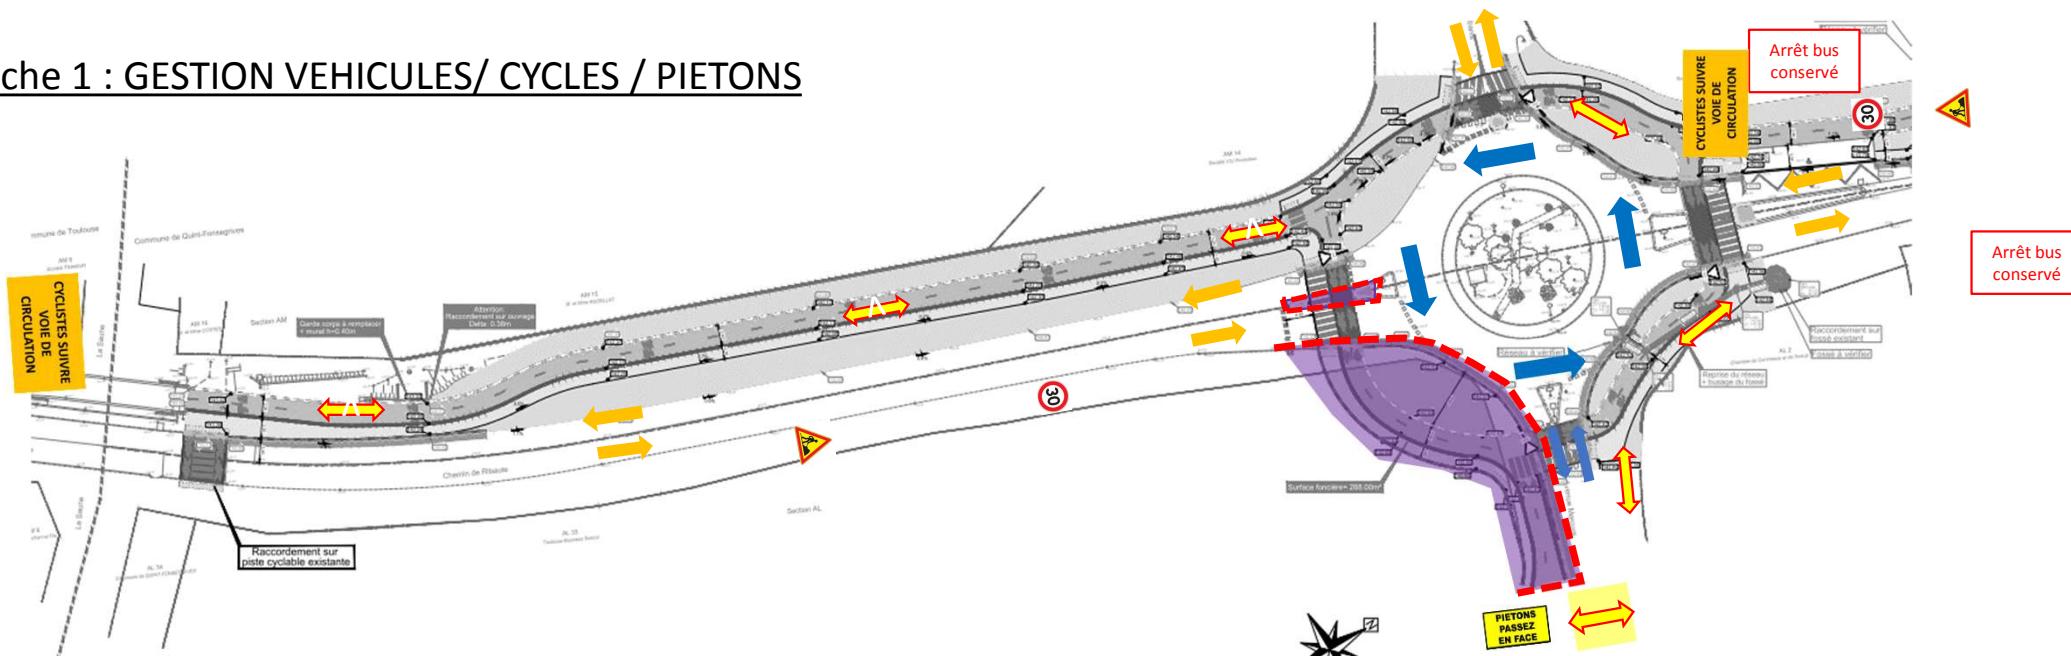- Travaux sur trottoir giratoire Ouest, zone fermée K16
- Circulation conservée en double sens, avec alternat manuel ponctuel pour travaux spécifiques le long de la voirie (bordures)
- Accès Urgence Clinique « Croix du Sud » maintenue 24h/24h
- Circulation piétonne déviée avant le passage piéton
- Accès maintenus à TBS (piétons, cycles, véhicules, bus)
- Déplacement provisoire arrêts bus « Fonsegrives Entiere » (ligne 83 + L1)

## Tranche 1 : GESTION VEHICULES/ CYCLES / PIETONS




### Légende

-  K16
-  Zone de travaux
-  Circulation véhicules/cycles zone chantier
-  Circulation véhicules/cycles hors chantier
-  Circulation piétons






### PHASE 1.3 (06/24 – 5 jours)

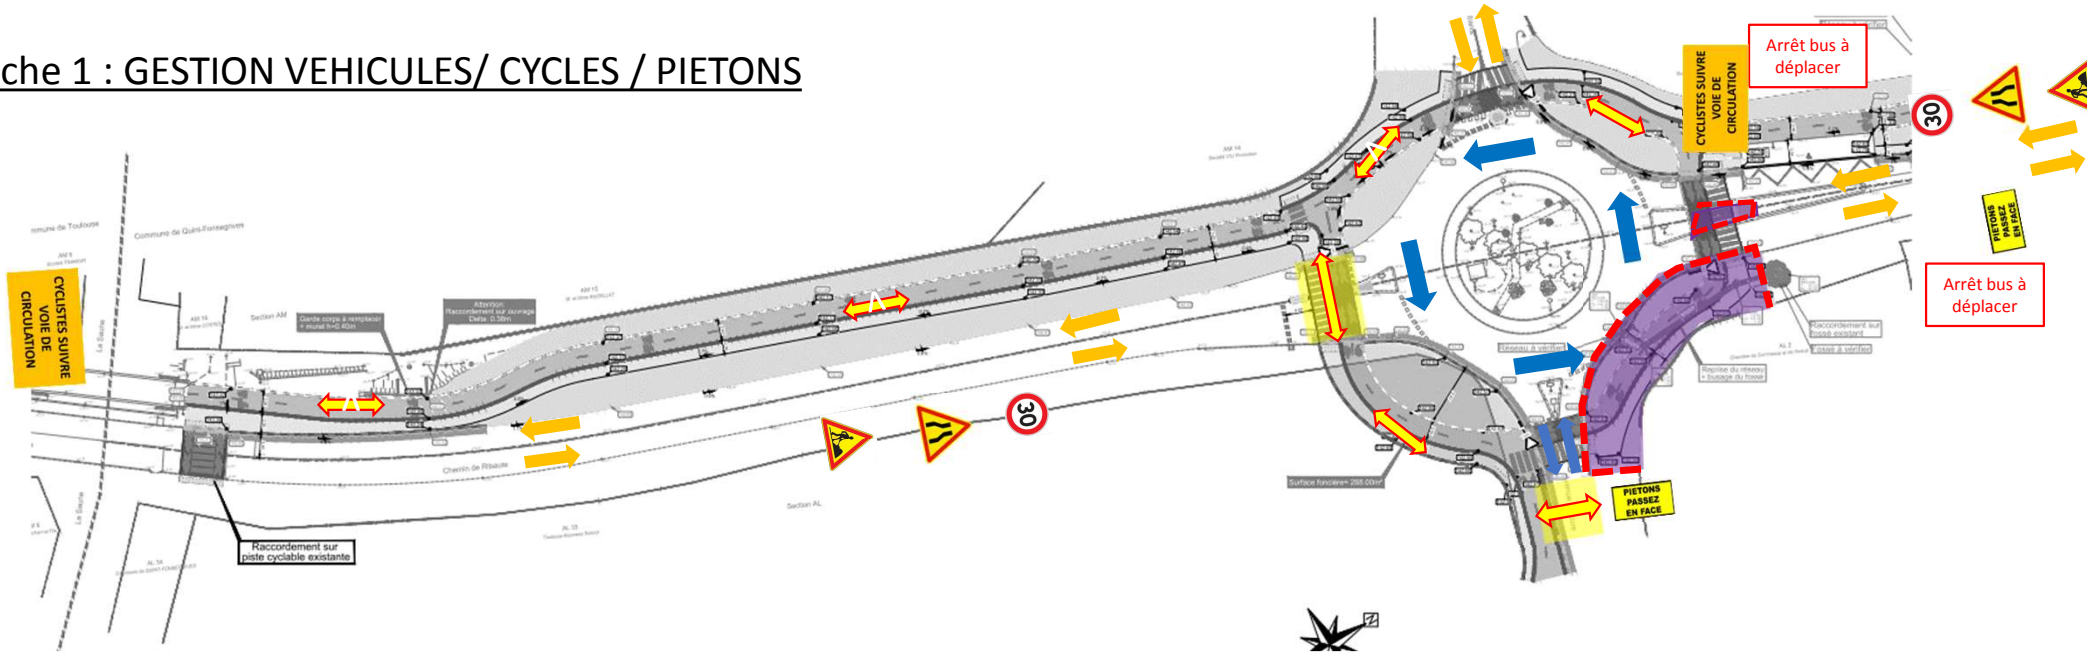- Travaux sur trottoir giratoire Est et îlot, zone fermée K16
- Circulation conservée en double sens, avec alternat manuel ponctuel pour travaux spécifiques le long de la voirie (bordures, îlot)
- Accès Urgence Clinique « Croix du Sud » maintenue 24h/24h
- Accès maintenus à TBS (piétons, cycles, véhicules, bus)
- Conservation arrêt bus « Fonsegrives Entiere » (ligne 83 + L1)

## Tranche 1 : GESTION VEHICULES/ CYCLES / PIETONS




### Légende

-  K16
-  Zone de travaux
-  Circulation véhicules/cycles zone chantier
-  Circulation hors chantier
-  Circulation piétons






### PHASE 1.4 (07/24 – 5 jours)

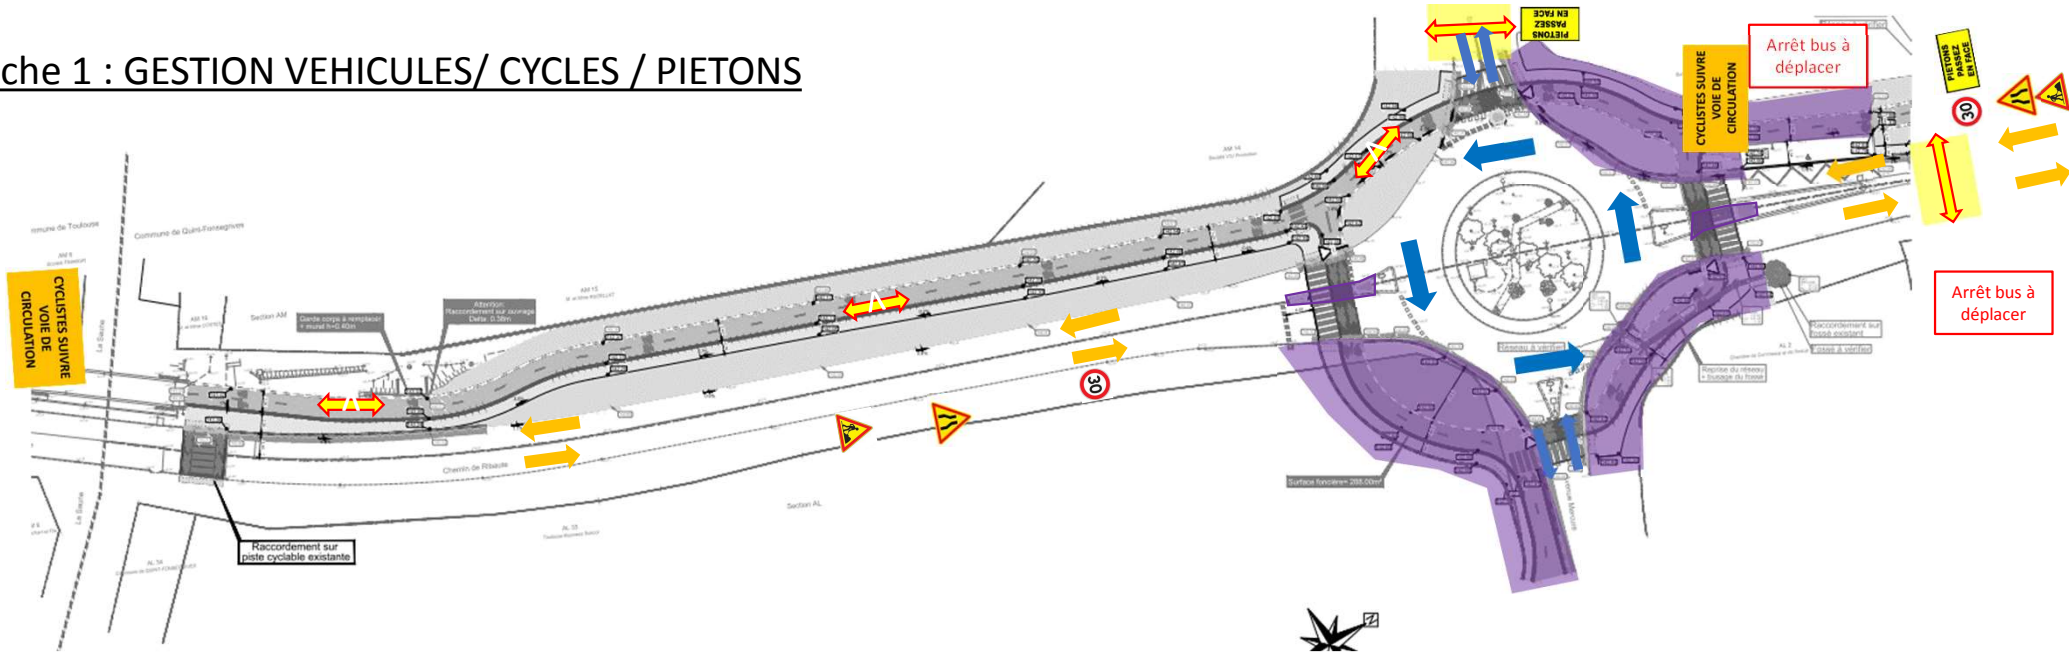- Travaux sur trottoir giratoire Est et îlot, zone fermée K16
- Circulation conservée en double sens, avec alternat manuel ponctuel pour travaux spécifiques le long de la voirie (bordures, îlot)
- Accès Urgence Clinique « Croix du Sud » maintenue 24h/24h
- Accès maintenus à TBS (piétons, cycles, véhicules, bus)
- Déplacement provisoire arrêts bus « Fonsegrives Entiere » (ligne 83 + L1)

# Tranche 1 : GESTION VEHICULES/ CYCLES / PIETONS



## Légende


-  K16
-  Zone de travaux
-  Circulation véhicules/cycles zone chantier
-  Circulation hors chantier
-  Circulation piétons + cycles

## PHASE 1.5 ( 07/24 )






- Travaux de revêtements (béton + enrobés) des phases 1.2 – 1.3 – 1.4
- Gestion de la circulation véhicules + piétons avec alternat manuel ponctuel
- Circulation des cyclistes sur la voie de circulation – zone limitée à 30km/h
- Accès maintenus à TBS (piétons, cycles, véhicules, bus)
- Déplacement provisoire arrêts bus « Fonsegrives Entiere » (ligne 83 + L1)

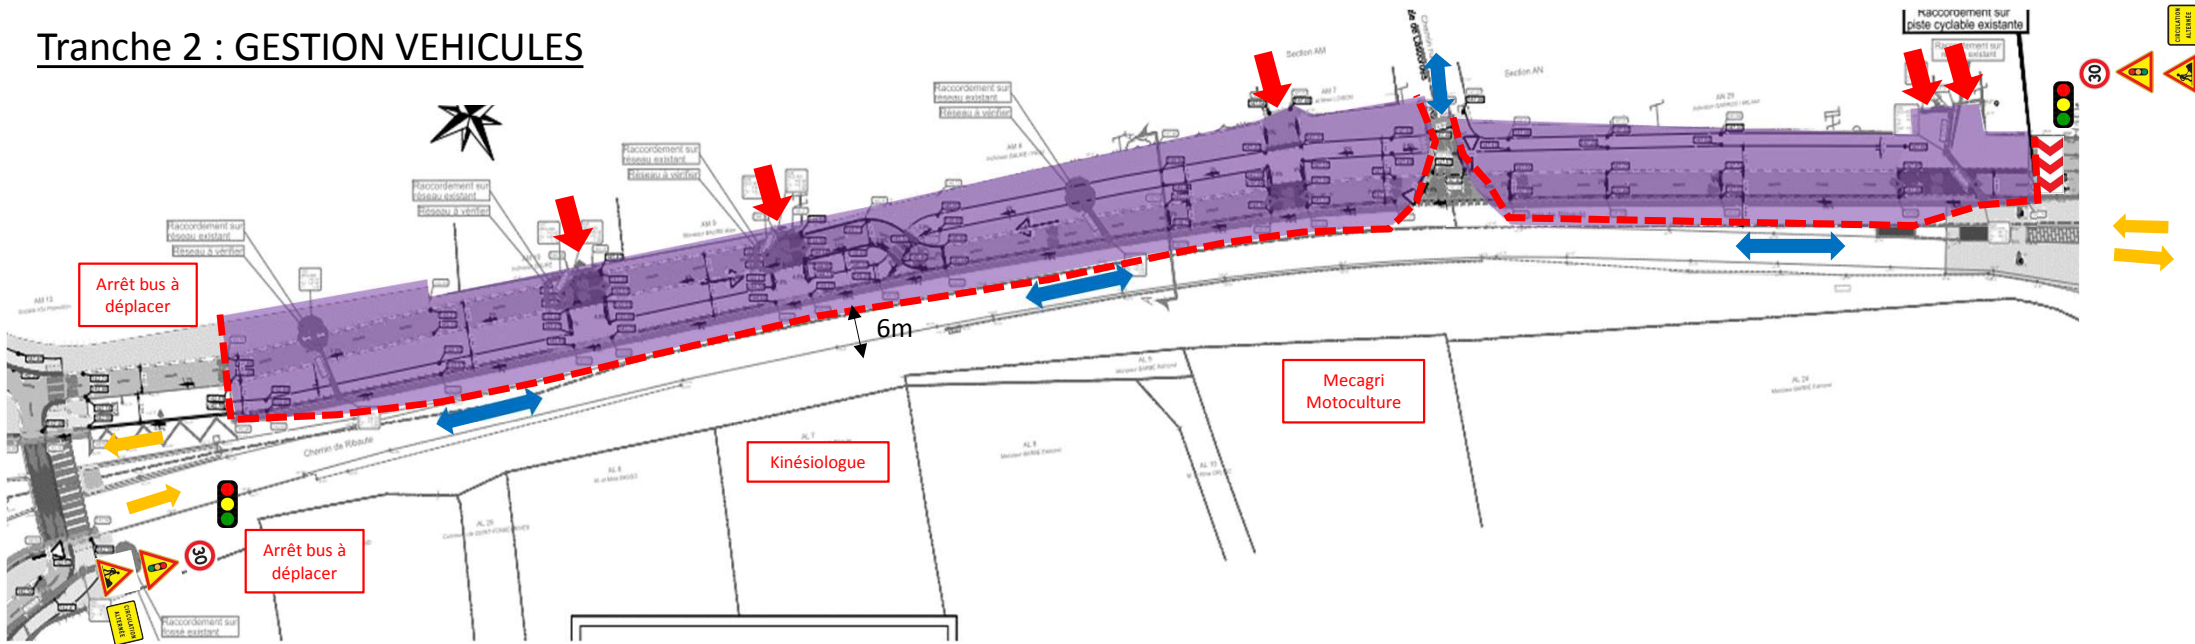

## Tranche 2 : GESTION VEHICULES




### Légende

-  K16
-  Zone de travaux
-  Circulation véhicules zone chantier
-  Circulation hors chantier
-  Accès particulier





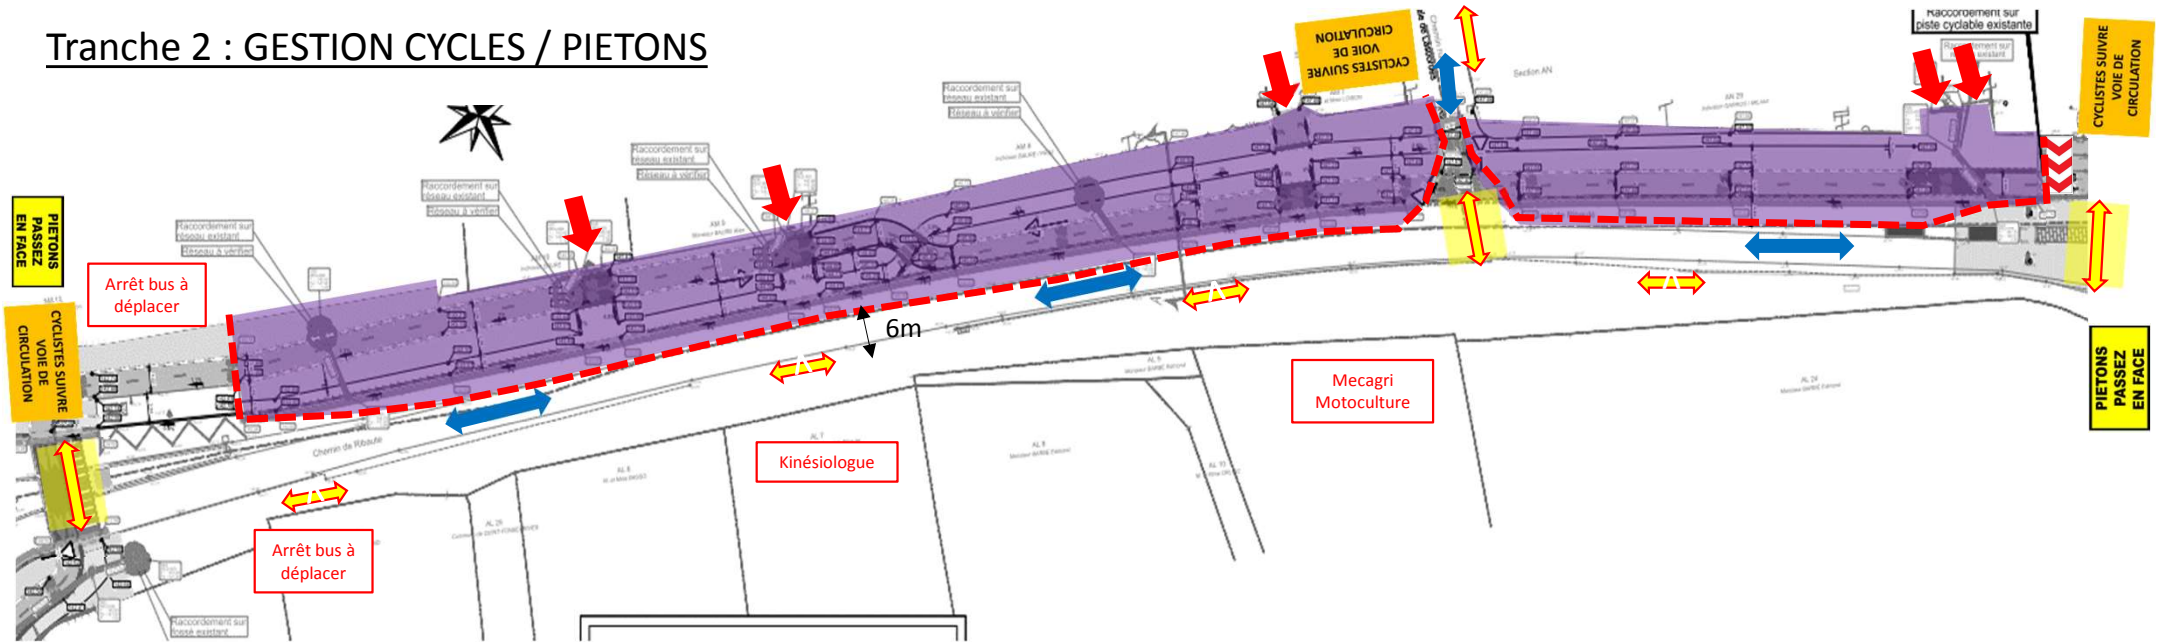

### PHASE 2 ( 07/24 – 08/24 )

- Travaux sur trottoir ouest, zone fermée K16
- Circulation des cyclistes sur la voie de circulation – zone limitée à 30km/h
- Circulation en demi-chaussée avec alternat par feux tricolores ponctuel
- Remise en circulation double-sens hors horaires de travaux
- Circulation piétonne déviée sur le cheminement existant opposé
- Accès riverains maintenus en mode dégradé, CR de Lasbordes maintenu
- Déplacement provisoire arrêts bus « Fonsegrives Entiore » (ligne 83 + L1)
- Accès Clinique et ZA Ribaute maintenus

## Tranche 2 : GESTION CYCLES / PIETONS




### Légende

	K16
	Zone de travaux
	Circulation véhicules/cycles zone chantier
	Circulation hors chantier
	Circulation piétons
	Accès particulier






### PHASE 2 ( 07/24 – 08/24 )

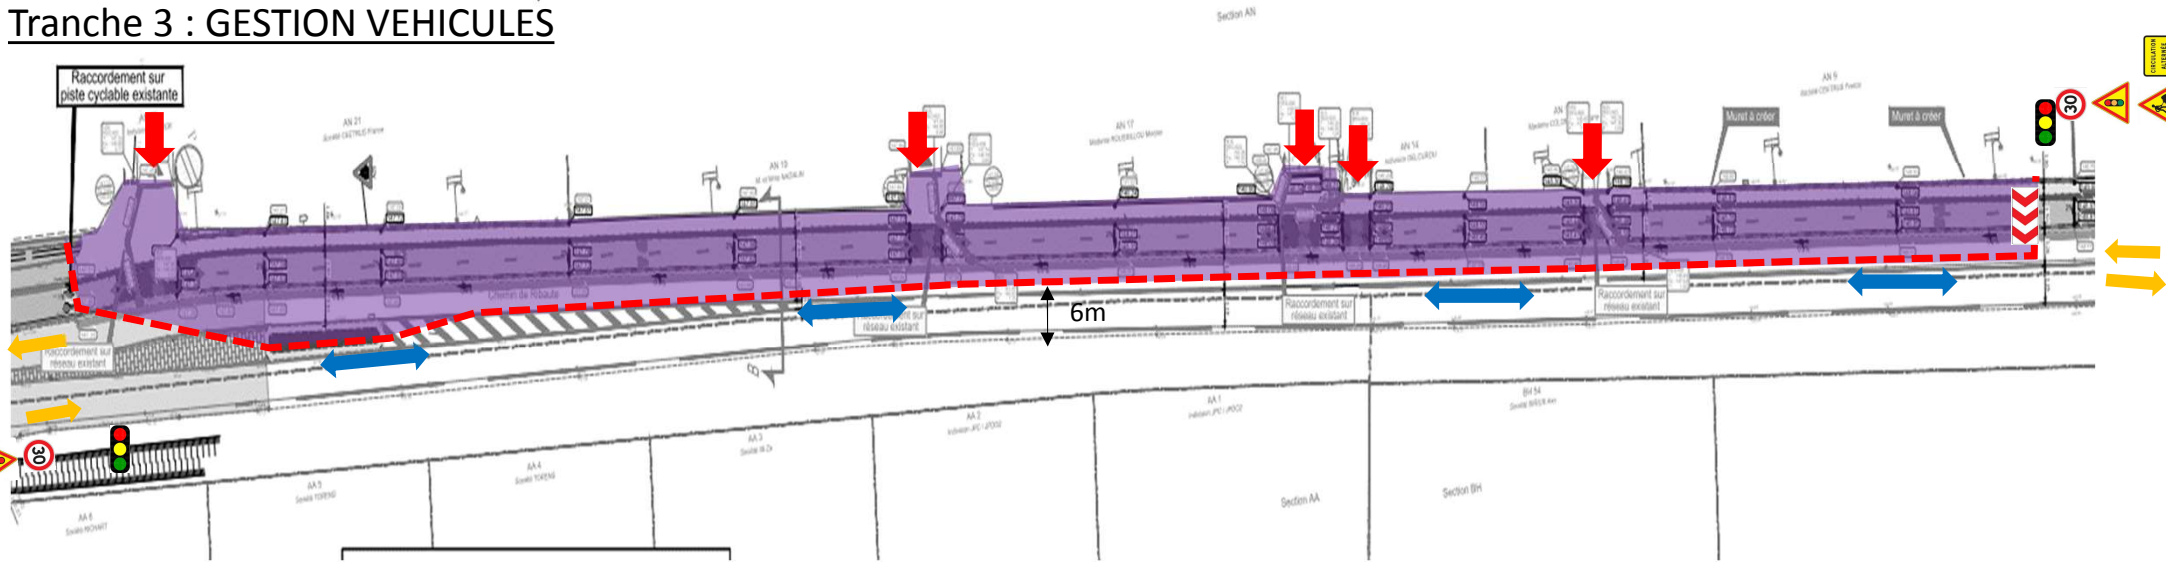- Travaux sur trottoir ouest, zone fermée K16 et barrières
- Circulation des cyclistes sur la voie de circulation – zone limitée à 30km/h
- Circulation piétonne déviée sur le cheminement existant opposé
- Accès riverains maintenus en mode dégradé, CR de Lasbordes maintenu
- Accès Clinique et ZA Ribaute maintenus

## Tranche 3 : GESTION VEHICULES




### Légende

-  K16
-  Zone de travaux
-  Circulation véhicules/cycles zone chantier
-  Circulation hors chantier
-  Accès particulier

### PHASE 3 (08/24 – 10/24)

- Travaux sur trottoir ouest, zone fermée K16
- Circulation en demi-chaussée avec alternat par feux tricolores ponctuel
- Remise en circulation double-sens hors horaires de travaux
- Accès riverains maintenus en mode dégradé, CR de Lasbordes maintenu
- Accès Clinique et ZA Ribaute maintenus

## Tranche 3 : GESTION CYCLES / PIETONS

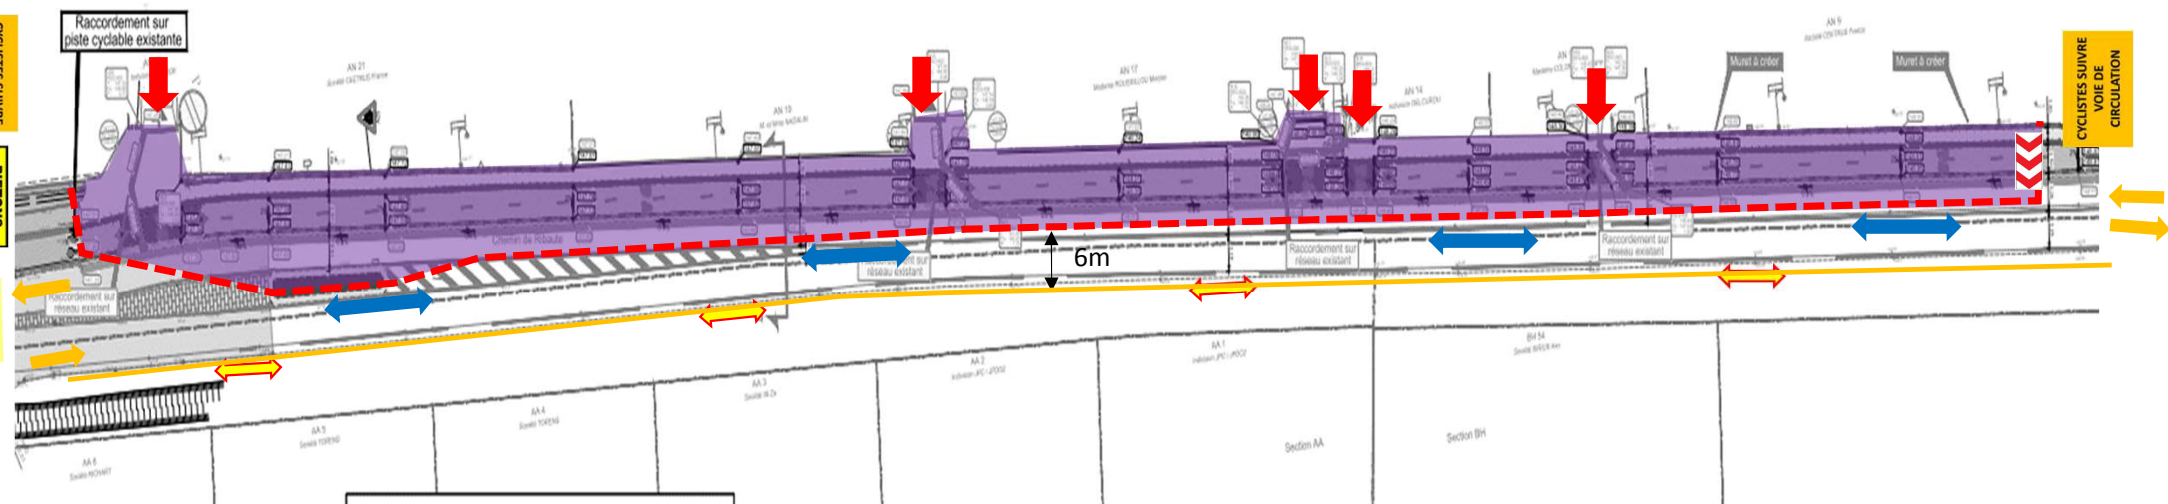


### Légende

- - - K16
- Zone de travaux
- ➔ Circulation véhicules/cycles zone chantier
- ➔ Circulation hors chantier
- ➔ Circulation piétons
- ➔ Accès particulier en mode dégradé
- Cheminement protection balisette





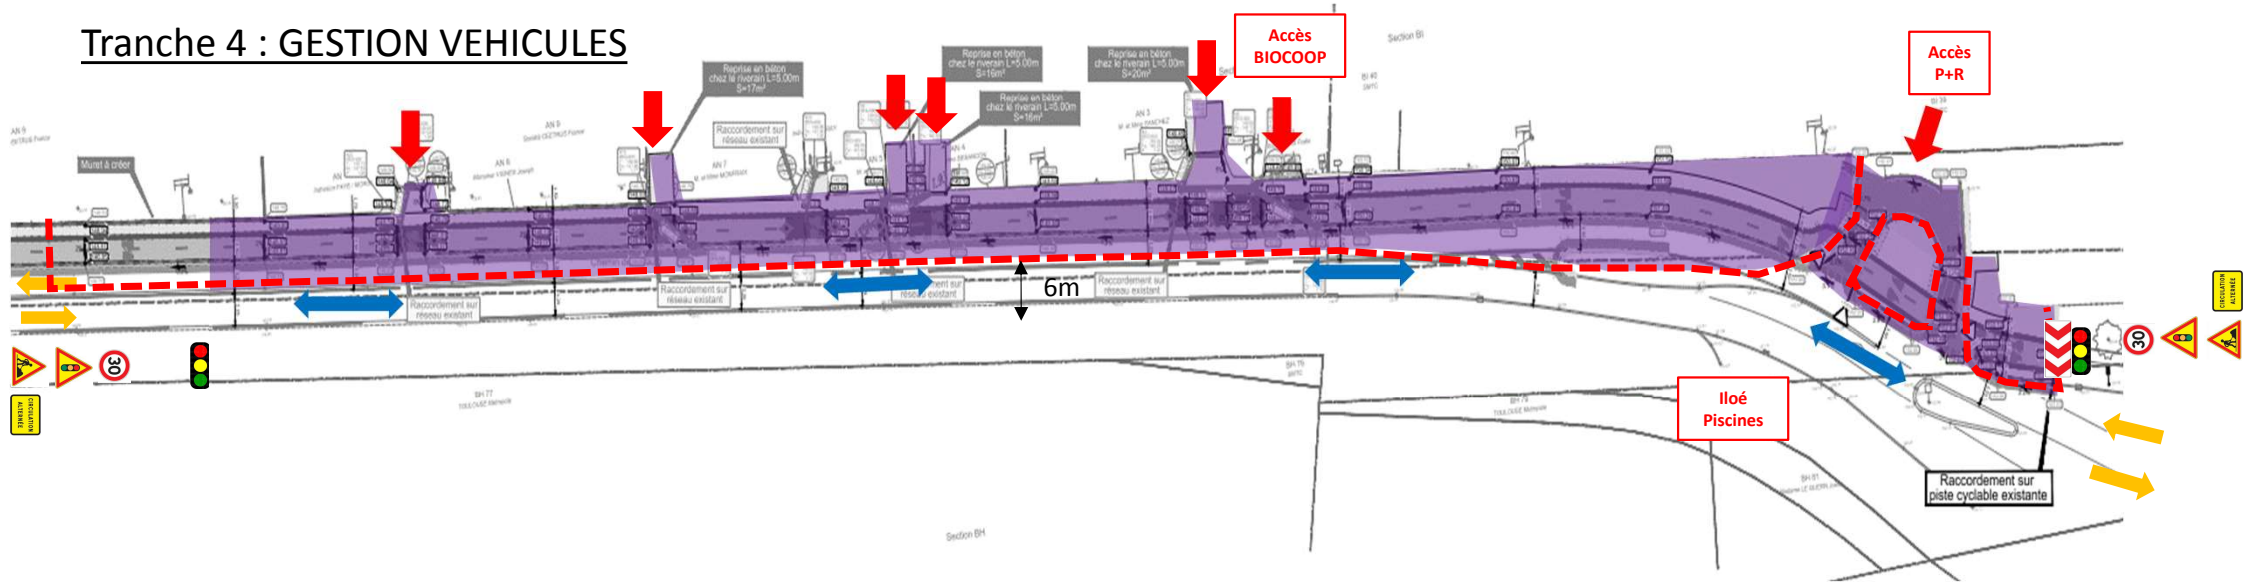

### PHASE 3 (08/24 – 12/24 )

- Travaux sur trottoir ouest, zone fermée K16
- Circulation des cyclistes sur la voie de circulation – zone limitée à 30km/h
- Circulation piétonne déviée sur cheminement opposé à créer – protégée par un balisage temporaire, type J11 sur toute la tranche 3 et 4
- Traversées piétonnes sur passages piétons existants
- Accès riverains maintenus en mode dégradé
- Accès Clinique et ZA Ribaute maintenus

## Tranche 4 : GESTION VEHICULES




### Légende

-  K16
-  Zone de travaux
-  Circulation véhicules/cycles zone chantier
-  Circulation hors chantier
-  Circulation piétons
-  Accès particulier en mode dégradé





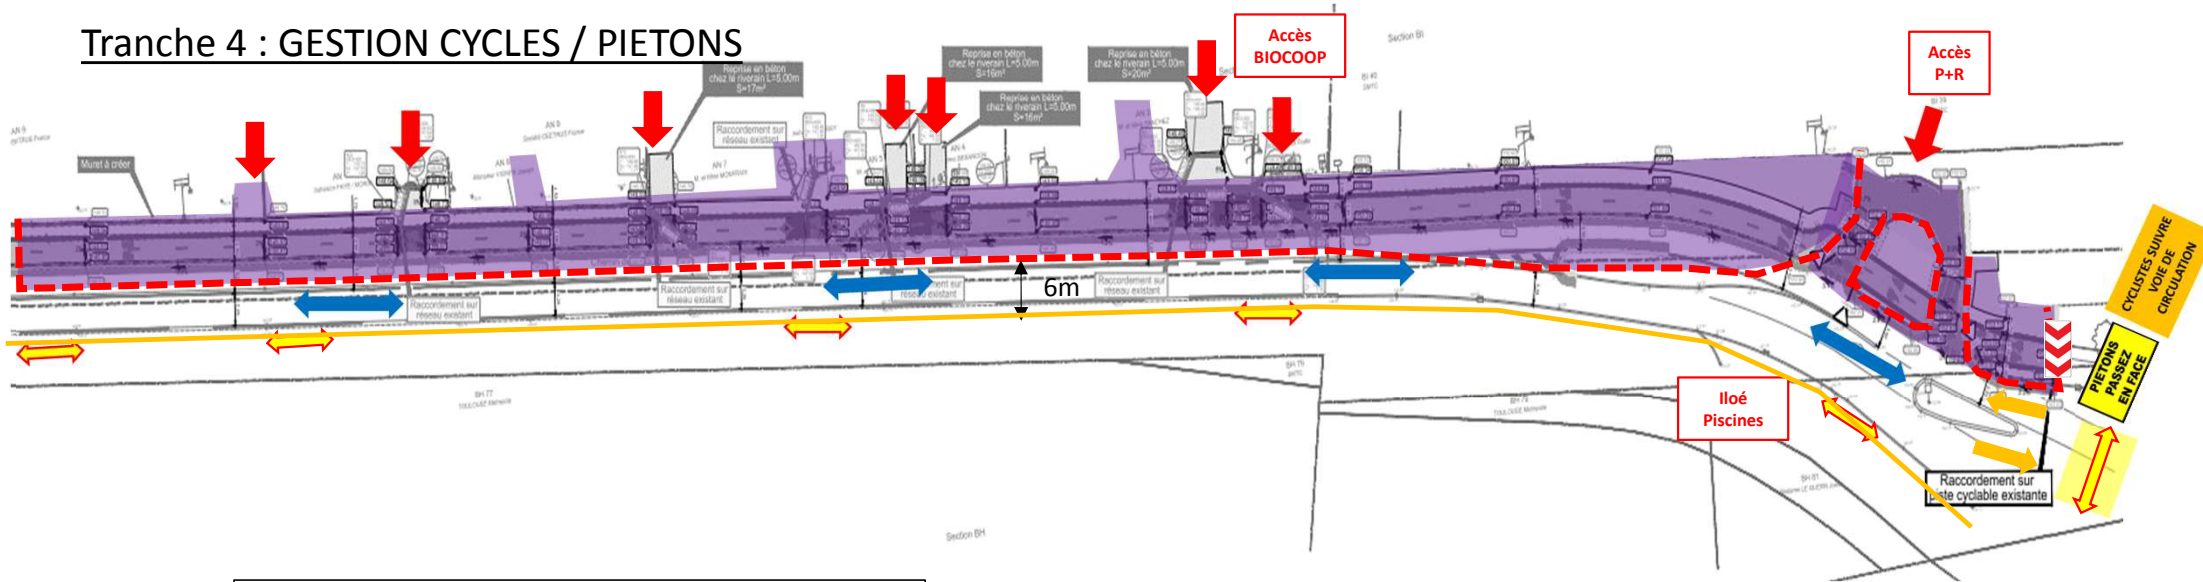


### PHASE 4 (10/24 – 12/24)

- Travaux sur trottoir ouest, zone fermée K16
- Circulation en demi-chaussée avec alternat par feux tricolores ponctuel
- Remise en circulation double-sens hors horaires de travaux
- Accès riverains maintenus en mode dégradé
- Accès BIOCOOP et Parking P+R Ribaute maintenus

## Tranche 4 : GESTION CYCLES / PIETONS



### Légende

-  K16
-  Zone de travaux
-  Circulation véhicules/cycles zone chantier
-  Circulation hors chantier
-  Circulation piétons
-  Accès particulier en mode dégradé
-  Cheminement protection balisette

### PHASE 4 (10/24 – 12/24)

- Travaux sur trottoir ouest, zone fermée K16
- Circulation des cyclistes sur la voie de circulation – zone limitée à 30km/h
- Circulation piétonne déviée sur cheminement opposé à créer – protégée par un balisage temporaire, type J11 sur toute la tranche 3 et 4
- Traversées piétonnes sur passages piétons existants
- Accès riverains maintenus en mode dégradé
- Accès Clinique et ZA Ribaute maintenus
